

Rețea PERT / CPM

SeniorWatch — planificare cu chain-uri paralele **embedded**, **mobile** și **web** (branch *feature/add-mobile-app*)

embedded

cloud

web

mobile

drum critic (R=0)

1. Tabel activități — calcul CPM


Nr.	Activitate	Modul	Pred.	D	ES	EF	LS	LF	R	Început	Final
1	Lansare proiect	cloud	—	3	0	3	0	3	0	26.03.2026	29.03.2026
2	Analiză cerințe EuroRec	cloud	1	16	3	19	3	19	0	29.03.2026	14.04.2026
3	Specificații + README	cloud	2	9	19	28	19	28	0	14.04.2026	23.04.2026
4	Proiectare + diagrame UML	cloud	3	15	28	43	28	43	0	23.04.2026	08.05.2026
5	Restructurare monorepo	cloud	4	1	43	44	43	44	0	08.05.2026	09.05.2026
6	Infrastructură AWS	cloud	5	10	44	54	44	54	0	09.05.2026	19.05.2026
7	Backend Spring Boot + DB	cloud	6	10	54	64	54	64	0	19.05.2026	29.05.2026
8	CI/CD + deploy producție	cloud	7	5	64	69	74	79	10	29.05.2026	03.06.2026
9	API clinic (pacienți, vizite, alergii)	cloud	7	5	64	69	64	69	0	29.05.2026	03.06.2026
10	Drivers ESP32 (puls / ECG / DHT)	embedded	5	14	44	58	51	65	7	09.05.2026	23.05.2026
11	Agregare cadre + BLE GATT server	embedded	10	10	58	68	65	75	7	23.05.2026	02.06.2026
12	Streaming ECG embedded	embedded	11	4	68	72	75	79	7	02.06.2026	06.06.2026
13	Bootstrap Android Kotlin + UI Compose	mobile	5	8	44	52	51	59	7	09.05.2026	17.05.2026
14	BleManager + Room DB + parser cadru	mobile	13	12	52	64	59	71	7	17.05.2026	29.05.2026
15	Sync offline + AccelCollector + Login JWT	mobile	9,14	8	69	77	71	79	2	03.06.2026	11.06.2026
16	Scaffold web + Login + api.js	web	6	8	54	62	61	69	7	19.05.2026	27.05.2026
17	Portal administrator + HL7 FHIR	web	9,16	5	69	74	74	79	5	03.06.2026	08.06.2026

Nr.	Activitate	Modul	Pred.	D	ES	EF	LS	LF	R	Început	Final
18	Portal medic (consultații, fișă, alergii)	web	9,16	10	69	79	69	79	0	03.06.2026	13.06.2026
19	Portal pacient + audit UI	web	9,16	8	69	77	71	79	2	03.06.2026	11.06.2026
20	Finalizare MVP	cloud	8,12,15,17 ,18,19	0	79	79	79	79	0	13.06.2026	13.06.2026


Durata totală: 79 zile · **Drum critic:** 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 9 → 18 → 20

$ES / EF = \text{cel mai devreme început} / \text{final}$ · $LS / LF = \text{cel mai târziu început} / \text{final}$ · $R = \text{rezervă} \cdot \text{ziua } 0 = 26.03.2026 \cdot \text{MVP livrat în ziua } 79 = 13.06.2026$

2. Diagramă rețea (activități în noduri) — flux paralel




2a. Faza 1 — lansare până la infrastructură (activități 1–6)

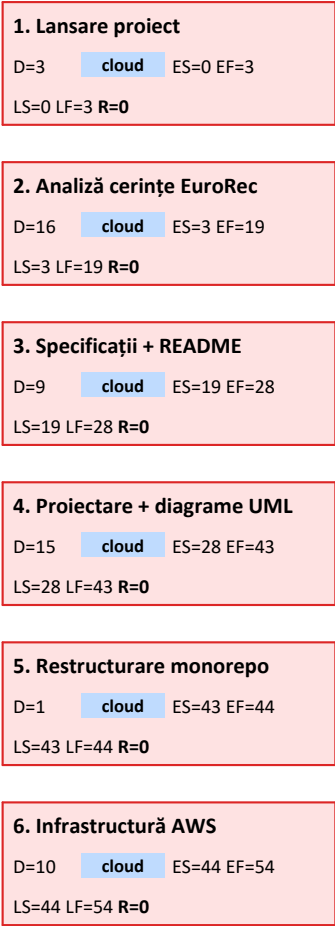

2b. Faza 2 — dezvoltare paralelă pe 4 module (activități 7, 9–18)

După **act. 6 — Infrastructură AWS**, dezvoltarea avansează în patru chain-uri paralele: **cloud backend** (act. 7, 9), **embedded** (act. 10–12), **mobile** (act. 13–15) și **web** (act. 16, 18). Drumul critic trece prin chain-ul cloud → portal medic. Mobile și embedded se sincronizează prin BLE GATT; mobile depinde de API REST pentru sync offline.

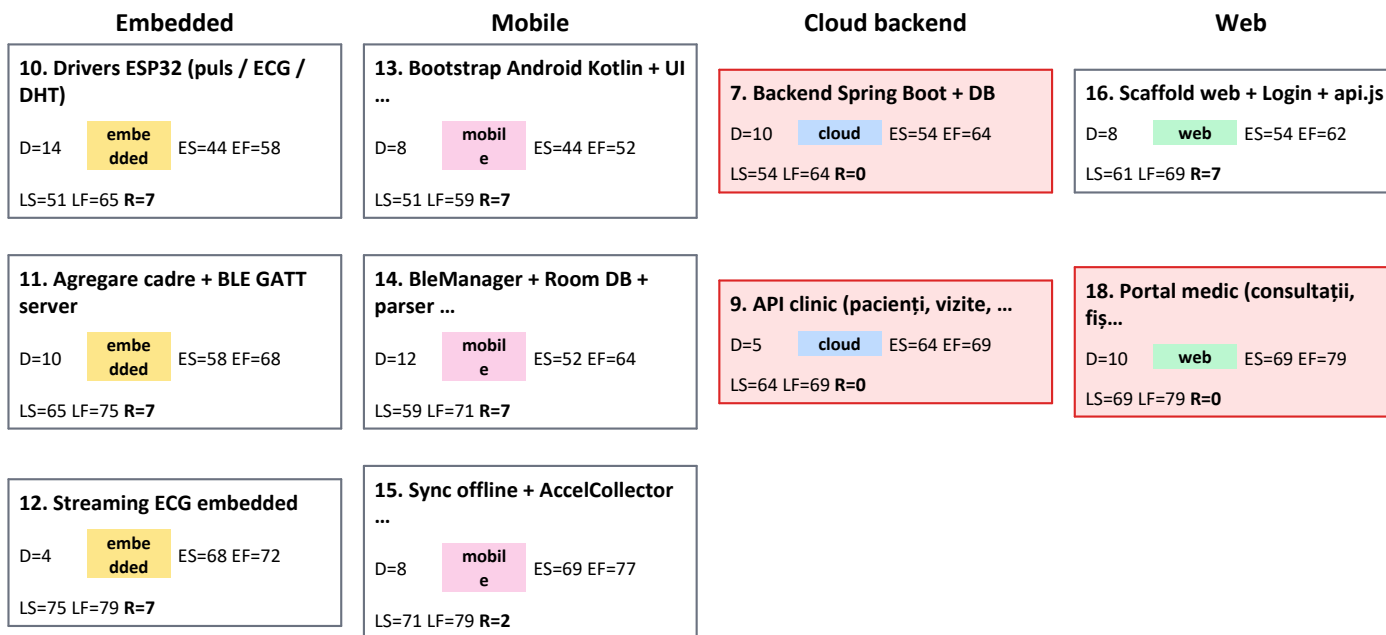

2c. Faza 3 — convergență și livrare MVP (activități 8, 17, 19, 20)

Portalul administrator, portalul pacient și pipeline-ul CI/CD se finalizează în paralel după activitățile 9 și 16. **Activitatea 20 — Finalizare MVP** este un punct de sincronizare la ziua 79 (13.06.2026) și depinde de toate chain-urile de dezvoltare.

17. Portal administrator + HL7 FHIR

D=5 **web** ES=69 EF=74
LS=74 LF=79 R=5

19. Portal pacient + audit UI

D=8 **web** ES=69 EF=77
LS=71 LF=79 R=2

8. CI/CD + deploy producție

D=5 **cloud** ES=64 EF=69
LS=74 LF=79 R=10

20. Finalizare MVP

D=0 **cloud** ES=79 EF=79
LS=79 LF=79 R=0
