

Rețea PERT / CPM

SeniorWatch - MPSAM-2026-AAL-01

ES / EF = cel mai devreme început/final · LS / LF = cel mai târziu început/final · R = rezervă · ziua 0 = 26.03.2026

■ drum critic (R = 0) □ activitate cu rezervă

1. Tabel activități - calcul CPM


Nr.	Activitate	Modul	Pred.	D	ES	EF	LS	LF	R	Început	Final
1	Lansare proiect	cloud	—	3	0	3	0	3	0	26.03.2026	29.03.2026
2	Analiză cerințe EuroRec	cloud	1	16	3	19	3	19	0	29.03.2026	14.04.2026
3	Specificații + README	cloud	2	9	19	28	19	28	0	14.04.2026	23.04.2026
4	Proiectare + diagrame UML	cloud	3	15	28	43	28	43	0	23.04.2026	08.05.2026
5	Spec. arhitectură mobile	mobile	3	12	28	40	67	79	39	23.04.2026	05.05.2026
6	Restructurare monorepo	cloud	4	1	43	44	43	44	0	08.05.2026	09.05.2026
7	Infrastructură AWS	cloud	6	10	44	54	44	54	0	09.05.2026	19.05.2026
8	Firmware embedded ESP32	embedded	6	19	44	63	60	79	16	09.05.2026	28.05.2026
9	Backend Spring Boot + DB	cloud	7	5	54	59	54	59	0	19.05.2026	24.05.2026
10	Scaffold web React	web	7	6	54	60	65	71	11	19.05.2026	25.05.2026
11	CI/CD + deploy producție	cloud	9	9	59	68	59	68	0	24.05.2026	02.06.2026
12	API clinic (pacienți, vizite)	cloud	9,11	5	68	73	68	73	0	02.06.2026	07.06.2026
13	Portal administrator + HL7	web	10,11	2	68	70	71	73	3	02.06.2026	04.06.2026
14	Portal medic	web	12,13	5	73	78	73	78	0	07.06.2026	12.06.2026
15	Portal pacient + audit	web	14	1	78	79	78	79	0	12.06.2026	13.06.2026
16	Finalizare MVP	cloud	5,8,15	0	79	79	79	79	0	13.06.2026	13.06.2026

Durata totală: 79 zile

Drum critic: 1 → 2 → 3 → 4 → 6 → 7 → 9 → 11 → 12 → 14 → 15 → 16

2. Diagramă rețea (activități în noduri) - flux vertical

2a. Faza 1 — lansare până la infrastructură (activități 1–8)

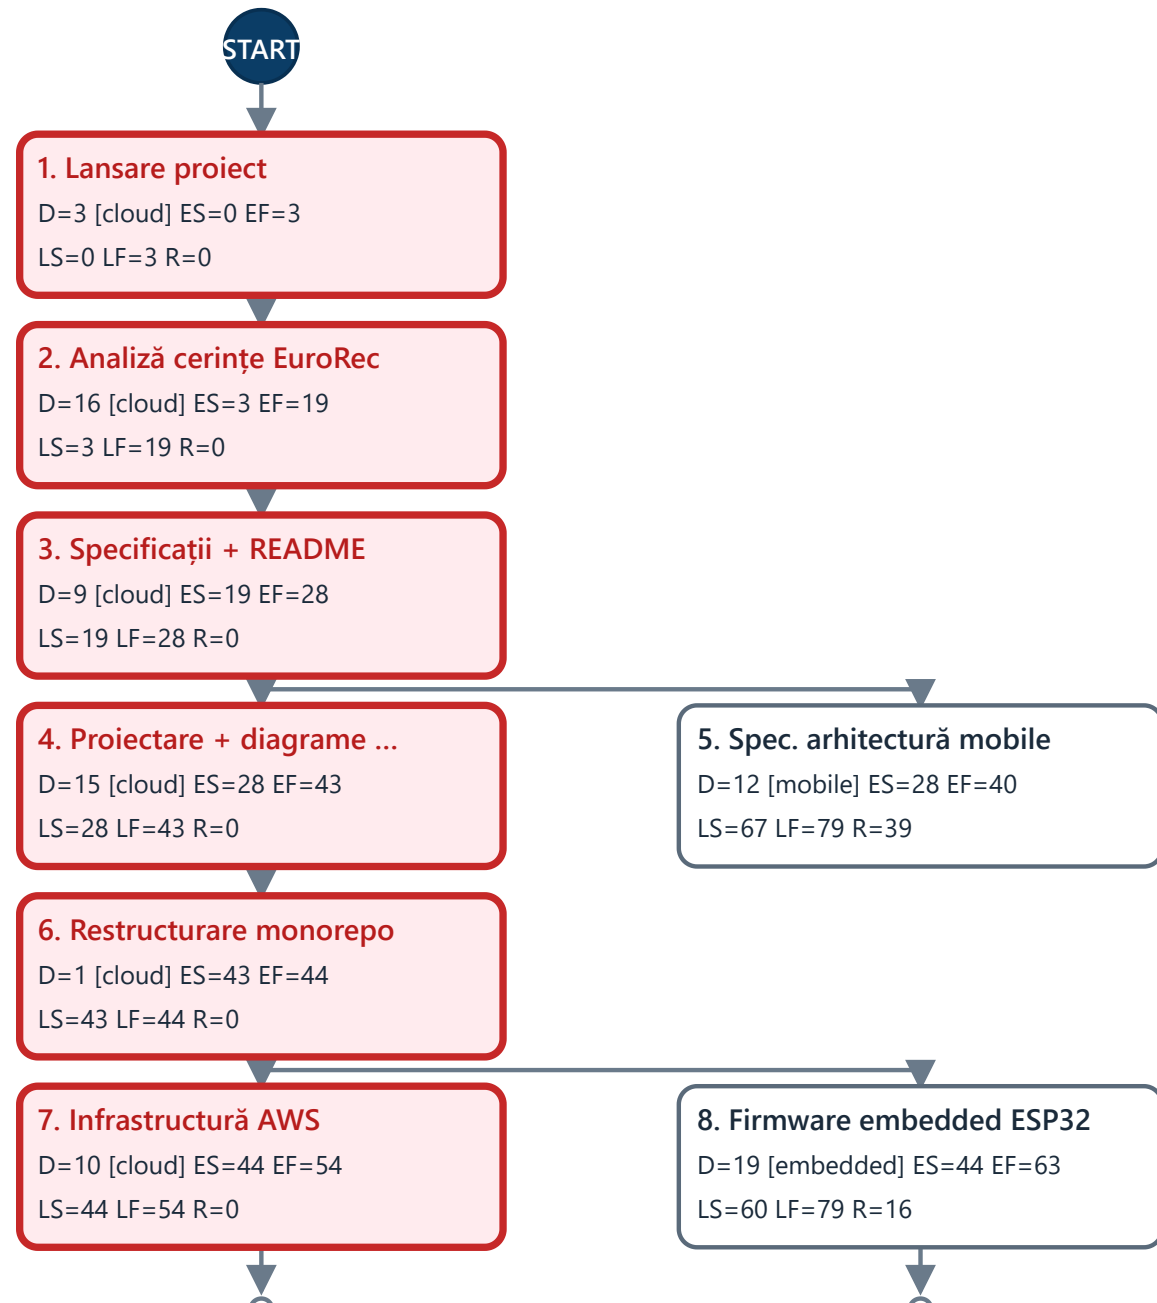

2b. Faza 2 — dezvoltare și livrare MVP (activități 9–16)

